

आवेदन क्रमांक... 100 8355996

सेवा में,


अभिशासी अभियन्ता,  
विद्युत वितरण खण्ड-शाहाबाद,  
हरदोई।

सहोदय,

कृपया आपके कार्यालय पत्रांक..... विद्युत वितरण खण्ड शाहाबाद हरदोई/पी0एफ0 दिनांक.....  
का संदर्भ गृहण करने की कृपा करें, जोकि विद्युत गार स्वीकृत हेतु आख्या प्रस्तुत किये जाने से सम्बन्धित है।  
आवेदक का नाम व पता:- राजवधर ४० नम्बर ग्राम मानपारा अनंगपुर हरदोई

प्रकमण शुल्क जमा धनराशि रू० 100 रशीद संख्या 100 8355996 दिनांक.....

1. आवेदित कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र/नगरपंचायत क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत है या बाहर?
2. विद्युत संयोजन देने हेतु प्रस्तावित लाइन ग्रामीण फीडर से जोड़ी जा रही है या टाउन फीडर से?
3. क्या प्रस्तावित संयोजन हेतु उपभोक्ता का परिसर निर्मित है?
4. आवेदक के नाम अन्य विद्युत कनेक्शन है/नहीं है का विवरण-
5. आवेदक पर बकाया विद्युत धनराशि का विवरण-
6. क्या संयोजन देने हेतु डी0पी0 परिसर के बाहर बनाया जाना सुनिश्चित किया जाना है?
7. मीटरिंग रूम परिसर के मेनगेट के पास अलग से बाह्य एवं मात्र एक दरवाजा के साथ सुनिश्चित किया गया है?
8. संयोजन अवमुक्त करने हेतु वोल्टेज क्या है?
9. टी/एफ विभाग का है या उपभोक्ता का? विभाग
10. टी/एफ की क्षमता क्या है? 2.5 KVA
11. 11 के0वी0 फीडर का नाम- मानपारा
12. 11 के0वी0 फीडर लाइन की लम्बाई-
13. 11 के0वी0 फीडर लोड-
14. पावर परिवर्तक की क्षमता-
15. पावर परिवर्तक लोड-
16. संयोजन निर्गत करने योग्य है अथवा नहीं-
17. संयोजन हेतु परिसर की लाइन से दूरी- 300 मीटर
18. मीटर प्रस्तावित-
18. लाइन चार्ट-

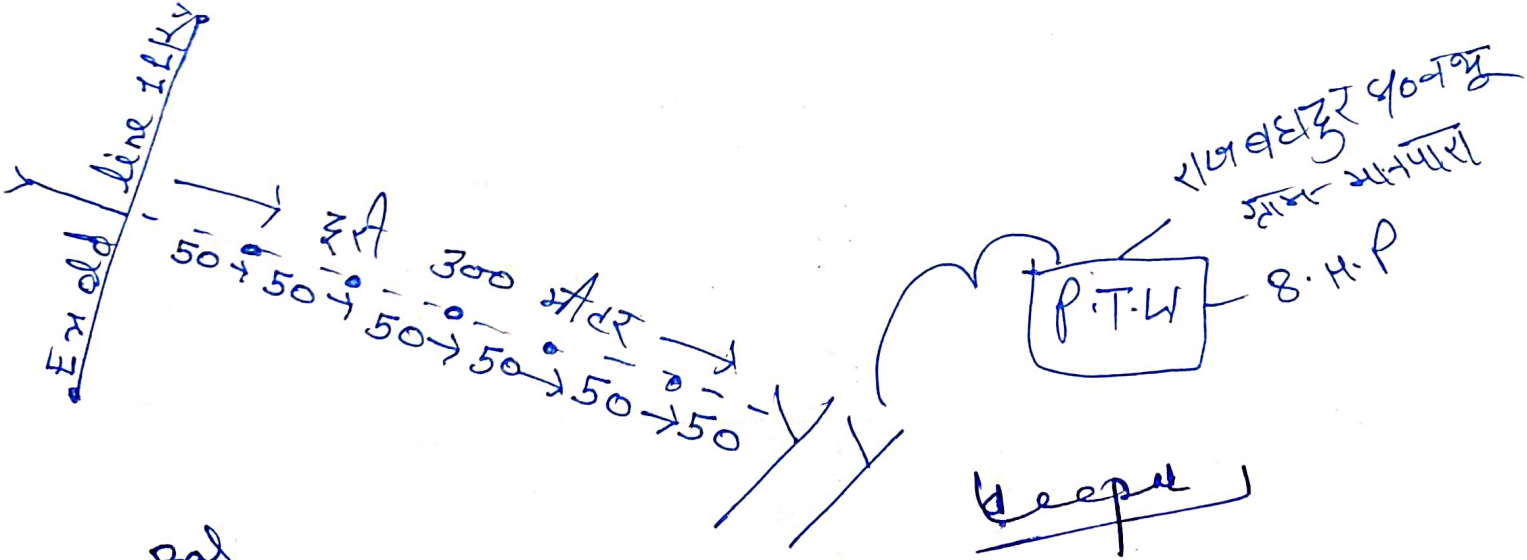

Bal

अवर अभियन्ता  
33/11 के0वी0 उपकेन्द्र-

उपखण्ड अधिकारी  
विद्युत वितरण उपखण्ड-

संस्तुति- आवेदक/उपभोक्ता को

**PROJECT ESTIMATE**

**MADHYANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.**

(A State Government Undertaking)

Head office 4-A, Gokhale Marg, Lucknow 226001

Ph No. 0522-2208737 GSTIN: 09AAECM0108J1ZO



Project Description

: PTW\_RAJ BHADUR SINGH\_1008355996,HT,LINE,

Project Code : MVDP.HR.PD0205

Estimate Value : 150,465.60

Estimate Printout Date : 05.12.2023

Previous Approved Version : N.A.

Fund (Project Code) : PTW\_DEPOSI

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
	connection charges - MVDP.HR.PD0205.1				
1	LABOUR AND OVERHEAD CHARGES				2,036.00
2	3PH-4W SATIC METER 30-60A WITH BOX				2,921.00
	Sub Total - Charges (Rs.)				4,957.00
	Total - connection charges - (Rs.)				4,957.00
	Material & Service-Lines&Cable - MVDP.HR.PD0205.A				
1	DISC INSULATOR 11 KV - 1700000124	No	6.000	167.00	1,002.00
2	DROPPER ANGLE - 1800000006	No	1.000	748.00	748.00
3	M.S. ANGLE 65X65X6 M.M. - 1800000000	KG	24.000	148.40	3,561.60
4	TEE-OFF CHANNEL - 1800000012	No	1.000	478.00	478.00
5	DISC FITTING FOR WESEL - 1700000123	No	6.000	97.00	582.00
6	HOLDING CLAMP FOR PCC POLE 8.5 MTR. - 2500000002	No	13.000	304.00	3,952.00
7	DANGER BOARD WITH CLAMP FOR 11KV LINE - 1700000113	No	2.000	461.00	922.00
8	STAY COMPLETE - 2700000152	No	3.000	2,027.00	6,081.00
9	PIN INSULATOR WITH PIN 11 KV - 2700000009	No	21.000	268.00	5,628.00
10	EARTHING COMPLETE - 2700000150	No	8.000	838.00	6,704.00
11	TOP CHANNEL - 1800000013	No	1.000	832.00	832.00
12	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	M	947.000	24.00	22,728.00
13	STONE PAD 300X300X75MM - 2700000147	No	8.000	140.00	1,120.00
14	11KV F-CLAMP FOR PCC POLE - 2500000048	No	6.000	265.00	1,590.00
15	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	No	8.000	2,721.00	21,768.00

	11 KV V-TYPE STEEL CROSS-ARM 65X65X6 MM - 2700000161	No	6.000	744.00	4,464.00
	<b>Sub Total - Material (Rs.)</b>				<b>82,160.60</b>
1	security charges - 1000001733	No	8.000	300.00	2,400.00
	<b>Sub Total - Services (Rs.)</b>				<b>2,400.00</b>
	<b>Total - Material &amp; Service-Lines&amp;Cable - (Rs.)</b>				<b>84,560.60</b>
	<b>Material &amp; Service-Plant&amp;Machinery - MVDP.HR.PD0205.B</b>				
1	TD 25KVA/11/0.43KV L-II 4 STAR AL. WOUND - 2000000006	No	1.000	56,780.00	56,780.00
	<b>Sub Total - Material (Rs.)</b>				<b>56,780.00</b>
	<b>Total - Material &amp; Service-Plant&amp;Machinery - (Rs.)</b>				<b>56,780.00</b>
	<b>Contingency Charges - MVDP.HR.PD0205.Z</b>				
1	Contingency Charges				4,168.00
	<b>Sub Total - Charges (Rs.)</b>				<b>4,168.00</b>
	<b>Total - Contingency Charges - (Rs.)</b>				<b>4,168.00</b>
	<b>Total(Materials + Services + Charges) (Rs.)</b>				<b>150,465.60</b>
	<b>Return Material - MVDP.HR.PD0205.1</b>				
	<b>Grand Total (Rs.)</b>				<b>150,465.60</b>

Amount in Words:

One Lakh Fifty Thousand Four Hundred Sixty Five Rupees Sixty Paise Only

मध्यांचल विद्युत वितरण मण्डल, हरदोई
