

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड-शाहाबाद,
हरदोई।

श्री - श्रीलामाऊ

महोदय,


कृपया आपके कार्यालय पत्रांक..... विद्युत वितरण खण्ड शाहाबाद हरदोई/पी0एफ0 दिनांक.....

का संदर्भ गृहण करने की कृपा करें, जोकि विद्युत भार स्वीकृत हेतु आख्या प्रस्तुत किये जाने से सम्बन्धित है।

आवेदक का नाम व पता- ~~श्री सुहापाल~~ ~~श्री राजाराम~~ ~~श्री - खड्डा मिताड~~
श्रीलामाऊ, हरदोई

प्रकमण शुल्क जमा धनराशि रू0..... रशीद संख्या..... दिनांक.....

1. आवेदित कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र/नगरपंचायत क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत है या बाहर?
2. विद्युत संयोजन देने हेतु प्रस्तावित लाइन ग्रामीण फीडर से जोड़ी जा रही है या टाउन फीडर से? **ग्रामीण**
3. क्या प्रस्तावित संयोजन हेतु उपभोक्ता का परिसर निर्मित है?
4. आवेदक के नाम अन्य विद्युत कनेक्शन है/नहीं है का विवरण-
5. आवेदक पर बकाया विद्युत धनराशि का विवरण-
6. क्या संयोजन देने हेतु डी0पी0 परिसर के बाहर बनाया जाना सुनिश्चित किया जाना है?
7. मीटरिंग रूम परिसर के मेनगेट के पास अलग से बाह्य एवं मात्र एक दरवाजा के साथ सुनिश्चित किया गया है?
8. संयोजन अवमुक्त करने हेतु वोल्टेज क्या है?
9. टी/एफ विभाग का है या उपभोक्ता का?
10. टी/एफ की क्षमता क्या है?
11. 11 के0वी0 फीडर का नाम- **श्रीलामाऊ**
12. 11 के0वी0 फीडर लाइन की लम्बाई-
13. 11 के0वी0 फीडर लोड-
14. पावर परिवर्तक की क्षमता-
15. पावर परिवर्तक लोड-
16. संयोजन निर्गत करने योग्य है अथवा नहीं-
17. संयोजन हेतु परिसर की लाइन से दूरी- **170मी0**
18. मीटर प्रस्तावित- **0**
19. लाइन चार्ट-

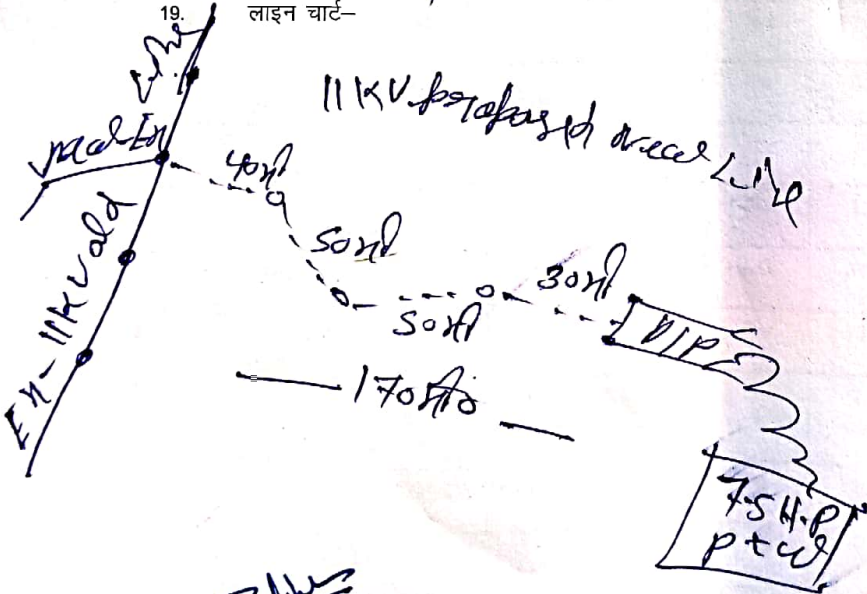

Prabhu
अवर अभियन्ता
33/11 के0वी0 उपकेन्द्र- **श्रीलामाऊ**

keeper
उपखण्ड अधिकारी
विद्युत वितरण उपखण्ड- **श्रीलामाऊ**

संस्तुति- आवेदक/उपभोक्ता को



PROJECT ESTIMATE

MADHYANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.

(A State Government Undertaking)
 Head office 4-A, Gokhale Marg, Lucknow 226001
 Ph No. 0522-2208737 GSTIN: 09AAECM0108J1ZO

Project Description : PTW_MAHIPAL_1008364546, HT,LINE,ESTIMATE
 Project Code : MVDP.HR.PD0805
 Estimate Value : 120,910.60
 Estimate Printout Date : 06.02.2024
 Previous Approved Version : N.A.
 Fund (Project Code) : PTW_DEPOSI

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
	connection charges - MVDP.HR.PD0805.1				
1	LABOUR AND OVERHEAD CHARGES				2,036.00
2	3PH-4W SATIC METER 30-60A WITH BOX				2,921.00
	Sub Total - Charges (Rs.)				4,957.00
	Total - connection charges - (Rs.)				4,957.00
	Material & Service-Lines&Cable - MVDP.HR.PD0805.A				
1	EARTHING COMPLETE - 2700000150	No	5.000	838.00	4,190.00
2	HOLDING CLAMP FOR PCC POLE 8.5 MTR. - 2500000002	No	10.000	304.00	3,040.00
3	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	No	5.000	2,721.00	13,605.00
4	DISC INSULATOR 11 KV - 1700000124	No	6.000	167.00	1,002.00
5	11KV F-CLAMP FOR PCC POLE - 2500000048	No	3.000	265.00	795.00
6	TOP CHANNEL - 1800000013	No	1.000	832.00	832.00
7	M.S. ANGLE 65X65X6 M.M. - 1800000000	KG	24.000	148.40	3,561.60
8	PIN INSULATOR WITH PIN 11 KV - 2700000009	No	12.000	268.00	3,216.00
9	11 KV V-TYPE STEEL CROSS-ARM 65X65X6 MM - 2700000161	No	3.000	744.00	2,232.00
10	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	M	546.000	24.00	13,104.00
11	STAY COMPLETE - 2700000152	No	3.000	2,027.00	6,081.00
12	DROPPER ANGLE - 1800000006	No	1.000	748.00	748.00
13	TEE-OFF CHANNEL - 1800000012	No	1.000	478.00	478.00
14	DISC FITTING FOR WESEL - 1700000123	No	6.000	97.00	582.00
	Sub Total - Material (Rs.)				53,466.60
1	security charges -	No	8.000	300.00	2,400.00

	1000001733				
		Sub Total - Services (Rs.)			
		Total - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.)			2,400.00
		Material & Service-Plant&Machinery - MVDP.HR.PD0805.B			55,866.60
1	TD 25KVA/11/0.43KV L-II 4 STAR AL. WOUND - 2000000006	No	1.000	56,780.00	56,780.00
		Sub Total - Material (Rs.)			
		Total - Material & Service-Plant&Machinery - (Rs.)			56,780.00
		Contingency Charges - MVDP.HR.PD0805.Z			56,780.00
1	Contingency Charges				
		Sub Total - Charges (Rs.)			3,307.00
		Total - Contingency Charges - (Rs.)			3,307.00
		Total(Materials + Services + Charges) (Rs.)			3,307.00
	Return Material - MVDP.HR.PD0805.1				120,910.60
		Grand Total (Rs.)			120,910.60
Amount in Words:		One Lakh Twenty Thousand Nine Hundred Ten Rupees Sixty Paise Only			

Prabir
JE

Geeta
(SPO)
