

सेवा में,


अधिशारी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड-शाहाबाद,
हरदोई।

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय पत्रांक 12889 विद्युत वितरण खण्ड शाहाबाद हरदोई/पी0एफ0 दिनांक 28.11.2023 का संदर्भ गृहण करने की कृपा करें, जोकि विद्युत भार स्वीकृत हेतु आख्या प्रस्तुत किये जाने से सम्बन्धित है।
आवेदक का नाम व पता:- राजकुमार शं. रामशंकर R/o अजिता चौकी केमल इस्टेट

प्रकमण शुल्क जमा धनराशि रु0 100 रशीद संख्या 111 दिनांक 26.11.2023

1. आवेदित कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र/नगरपंचायत क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत है या बाहर?
2. विद्युत संयोजन देने हेतु प्रस्तावित लाइन ग्रामीण फीडर से जोड़ी जा रही है या टाउन फीडर से?
3. क्या प्रस्तावित संयोजन हेतु उपभोक्ता का परिसर निर्मित है? ~~नहीं~~
4. आवेदक के नाम अन्य विद्युत कनेक्शन है/नहीं है का विवरण- ~~नहीं~~
5. आवेदक पर बकाया विद्युत धनराशि का विवरण- ~~नहीं~~
6. क्या संयोजन देने हेतु डी0पी0 परिसर के बाहर बनाया जाना सुनिश्चित किया जाना है? ~~नहीं~~
7. मीटरिंग रूम परिसर के मेनगेट के पास अलग से बाह्य एवं मात्र एक दरवाजा के साथ सुनिश्चित किया गया है? ~~नहीं~~
8. संयोजन अवमुक्त करने हेतु वोल्टेज क्या है? 11kV
9. टी/एफ विभाग का है या उपभोक्ता का? विभाग का
10. टी/एफ की क्षमता क्या है? 25kVA
11. 11 के0वी0 फीडर का नाम- चंदेली
12. 11 के0वी0 फीडर लाइन की लम्बाई- 65 km.
13. 11 के0वी0 फीडर लोड- 90A
14. पावर परिवर्तक की क्षमता- 10MVA
15. पावर परिवर्तक लोड- 390A
16. संयोजन निर्गत करने योग्य है अथवा नहीं- ~~नहीं~~
17. संयोजन हेतु परिसर की लाइन से दूरी- 40 मी
18. मीटर प्रस्तावित- ~~नहीं~~
19. लाइन चार्ट-

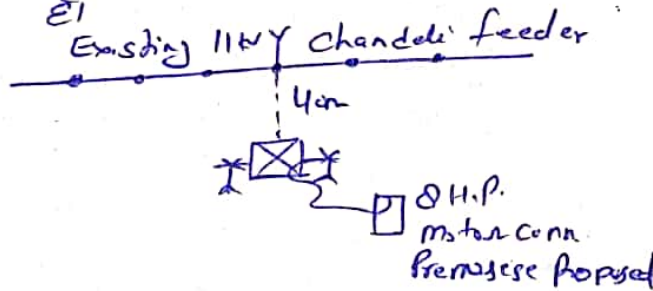

PCC Pole - 02
T/F - 25kVA
Ward - 160 मी -


अवर अभियन्ता

33/11 के0वी0 उपकेन्द्र-


उपखण्ड अधिकारी

विद्युत वितरण उपखण्ड-

संस्तुति- आवेदक/उपभोक्ता को



PROJECT ESTIMATE

MADHYANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.

(A State Government Undertaking)

Head office 4-A, Gokhale Marg, Lucknow 226001

Ph No. 0522-2208737 GSTIN: 09AAECM0108JIZO

Project Description : PTW_RAMKUMAR_CHAUKI_1008355073

Project Code : MVDP.HR.PD0226

Estimate Value : 89,145.47

Estimate Printout Date : 05.12.2023

Previous Approved Version : N.A.

Fund (Project Code) : PTW_DEPOSI

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
	Material & Service-Lines&Cable - MVDP.HR.PD0226.A				
1	EARTHING COMPLETE - 2700000150	No	2.000	838.00	1,676.00
2	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	No	2.000	2,721.00	5,442.00
3	11 KV PIN NUT WITH - 2700000263	No	6.000	72.00	432.00
4	PIN INSULATOR 11 KV - 2700000006	No	6.000	196.00	1,176.00
5	DROPPER ANGLE - 1800000006	No	1.000	748.00	748.00
6	HOLDING CLAMP FOR PCC POLE 8.5 MTR. - 2500000002	No	12.000	304.00	3,648.00
7	STAY COMPLETE - 2700000152	No	3.000	2,027.00	6,081.00
8	TEE-OFF CHANNEL - 1800000012	No	1.000	478.00	478.00
9	STONE PAD 300X300X75MM - 2700000147	No	2.000	140.00	280.00
10	M.S. ANGLE 65X65X6 M.M. - 1800000000	KG	24.000	148.00	3,552.00
11	11 KV DISC INSULATOR 45 KN (PORCELAIN) - 2700000293	No	6.000	167.00	1,002.00
12	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	M	160.000	24.00	3,840.00
13	11KV DISC FITTING (B&S) 45KN(SET) - 2700000512	SET	6.000	97.00	582.00
14	TOP CHANNEL - 1800000013	No	1.000	832.00	832.00
	Sub Total - Material (Rs.)				29,769.00
	Total - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.)				29,769.00
	Material & Service-Plant&Machinery - MVDP.HR.PD0226.B				
1	TD 25KVA/11/0.43KV L-II 4 STAR AL. WOUND - 2000000006	No	1.000	56,780.00	56,780.00
	Sub Total - Material (Rs.)				56,780.00

	Total - Material & Service-Plant&Machinery - (Rs.)		56,780.00
	Contingency Charges - MVDP.HR.PD0226.Z		
1	Contingency Charges		2,596.47
	Sub Total - Charges (Rs.)		2,596.47
	Total - Contingency Charges - (Rs.)		2,596.47
	Total(Materials + Services + Charges) (Rs.)		89,145.47
	Return Material - MVDP.HR.PD0226.A		
	Grand Total (Rs.)		89,145.47

Amount in Words: Eighty Nine Thousand One Hundred Forty Five Rupees Forty Seven Paise Only

(JE-E&M)

Sompal .

11001367

APPROVED - 05.12.2023

(AE-E&M)

Kuldeep Singh

11001355

Chb. Head... P.T.U./P-Set
 Sanction No SBD/..... 2023-24
 Chb. To UPPCL Rs.. NIL
 Chb. To Consumer Rs.. 89145 = 00
 TOTAL Rs 89145 = 00

Rs. Eighty Nine Thousand
 One Hundred Forty Five Paise Only

E.A. Eng.

FDD, Shahabad, Hardoi
